


Date: **mardi 6 septembre 2016**

Côte Plan d'eau : **105,80**

Volume d'eau restant estimé : **600 000 m³**



CALENDRIER DE VIDANGE DU BARRAGE

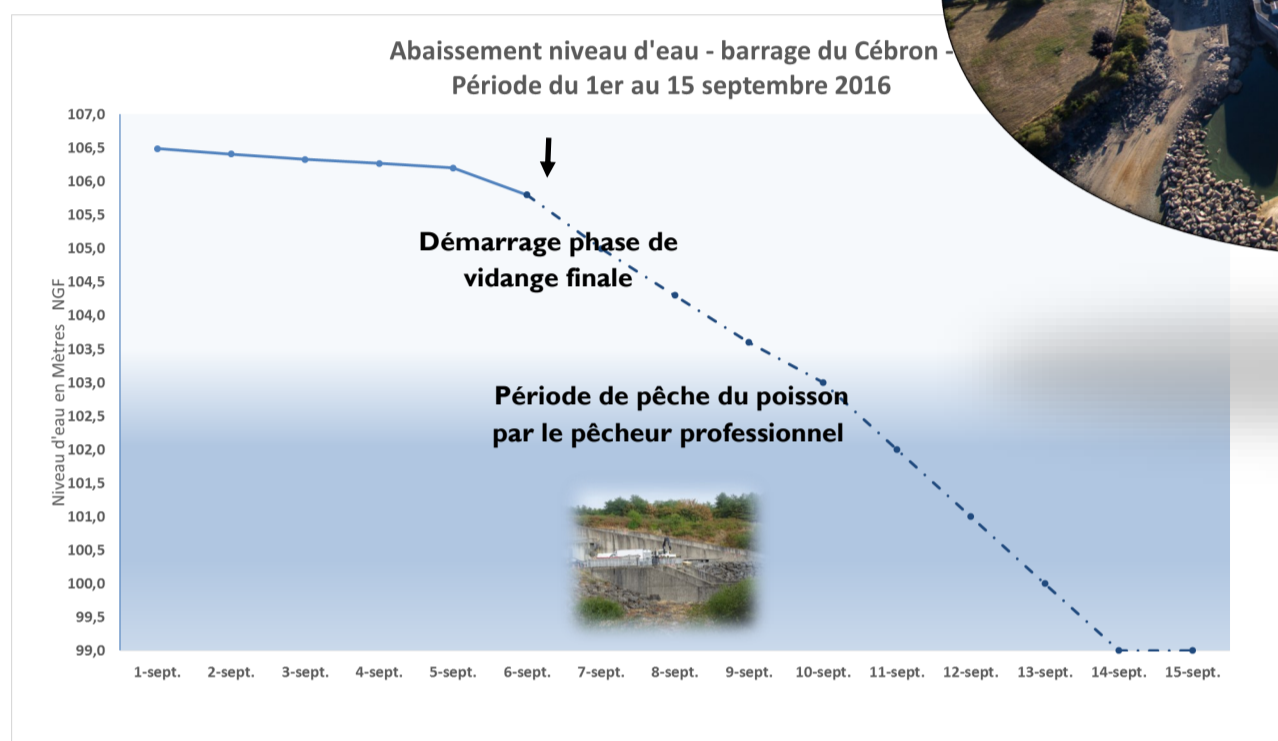

LES TRAVAUX SUR LE BARRAGE



Tour de prise d'eau

Les lots de travaux du barrage sont tous engagés. Trois entreprises sont présentes et opèrent sur le **béton**, les **évacuateurs de crues** et la **tour de prise d'eau**.



Evacuateurs de crues

LA PECHERIE

M. Baillet et l'équipe AB pêcheurie de Loire ont installé la pêcherie lundi 5 septembre. Un ponton flottant et un filet de 22 mètres de longueur sont disposés à la sortie de la galerie des vidanges de fond pour collecter le poisson qui dévalera. D'ici 24 à 48 heures, le poisson devrait faire son apparition. A ce jour la disponibilité en oxygène dans la retenue est encore correcte (7mg/l). En dessous de 5mg/l, la vie aquatique est perturbée.



Ponton flottant



Filet de pêche



Arrivée de l'eau par la galerie de vidange de fond rive droite
